

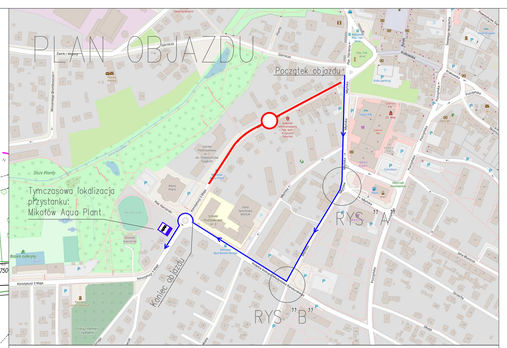

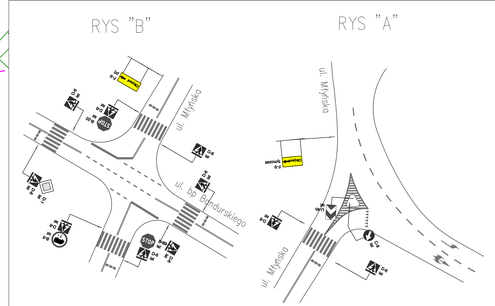

ETAP 2

– zamknięcie jednokierunkowego odcinka ul. Konstytucji o długości 300 m z wyłączeniem objazdu ulicami: Mityską oraz bp. Władysława Bandurskiego
– przywrócenie ruchu na dwukierunkowym odcinku ulicy Konstytucji od rondo do Szkoły Podstawowej nr 1
– tymczasowa zmiana lokalizacji przystanku autobusowego: Mikołów Aqua Plant

UWAGI:
– projekt zakłada układanie rur w wykopie zabezpieczonym obudową rozporową.
– prace prowadzić odcinkami o długości wykopu nieprzekraczającej 20 m.
– zachować ciągłość komunikacji w obszarze chodników poprzez odcinkowe wykonanie przyłączy lub zastosowanie kładek pieszych U-28 zgodnie z rys. C.

Biuro Projektów
PROPOL
44-100 Gliwice ul. Rabinowa 2 tel. (0-32) 270-89-51
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Piotr Wojtyła nr. upr. bud. PL/0456/POOK/08
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Michał Urbańczyk
DATA: marzec 2021
SKALA: 1 : 500
BRANŻA: Inżynieria ruchu
STADIUM: PW
TREŚĆ RYS.: Sytuacja. Tymczasowa organizacja ruchu. Etap 2
NR PROJ.: 47/02/2019
NR RYS.: 03
